
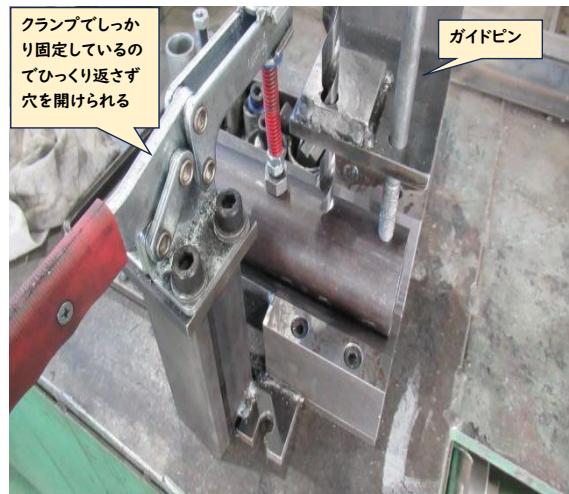


改善事例

支柱レスキー穴あけ治具製作

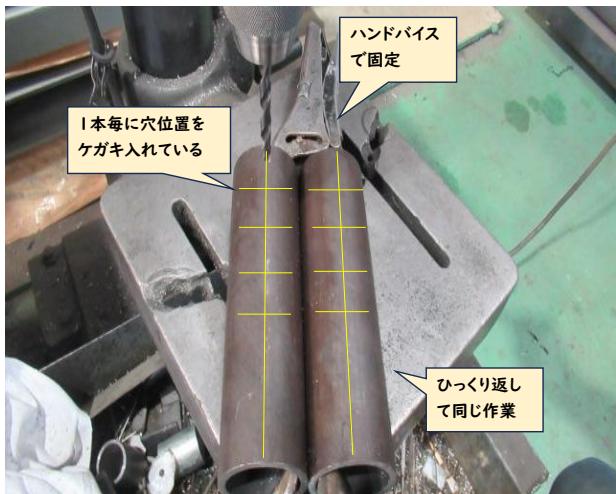

改善前：パイプ2本をハンドバイスで固定。ヤスリで頂点をケガキ、穴位置をケガキ入れてポンチを打ち込んだ後、穴あけをしている。ひっくり返して裏もあけている。

改善後：穴あけ治具を製作した。パイプを固定して裏まで穴を開けるようになり、空いた穴にガイドピンを入れて等間隔に開けるようになった。

効果：1本あたり穴あけ時間

327秒→135秒 192秒の短縮

年間500本予想 ￥96,000の効果
